
Сравнение коммерческих предложений по ПС 110/10 кВ и ВЛ 110 кВ

Стоимость строительства объекта по предложениям 4 подрядчиков · 45 позиций ведомости объёмов · руб. без НДС · цены на 31.03.2026 · учебные данные

Полная стоимость по подрядчикам, млн руб.

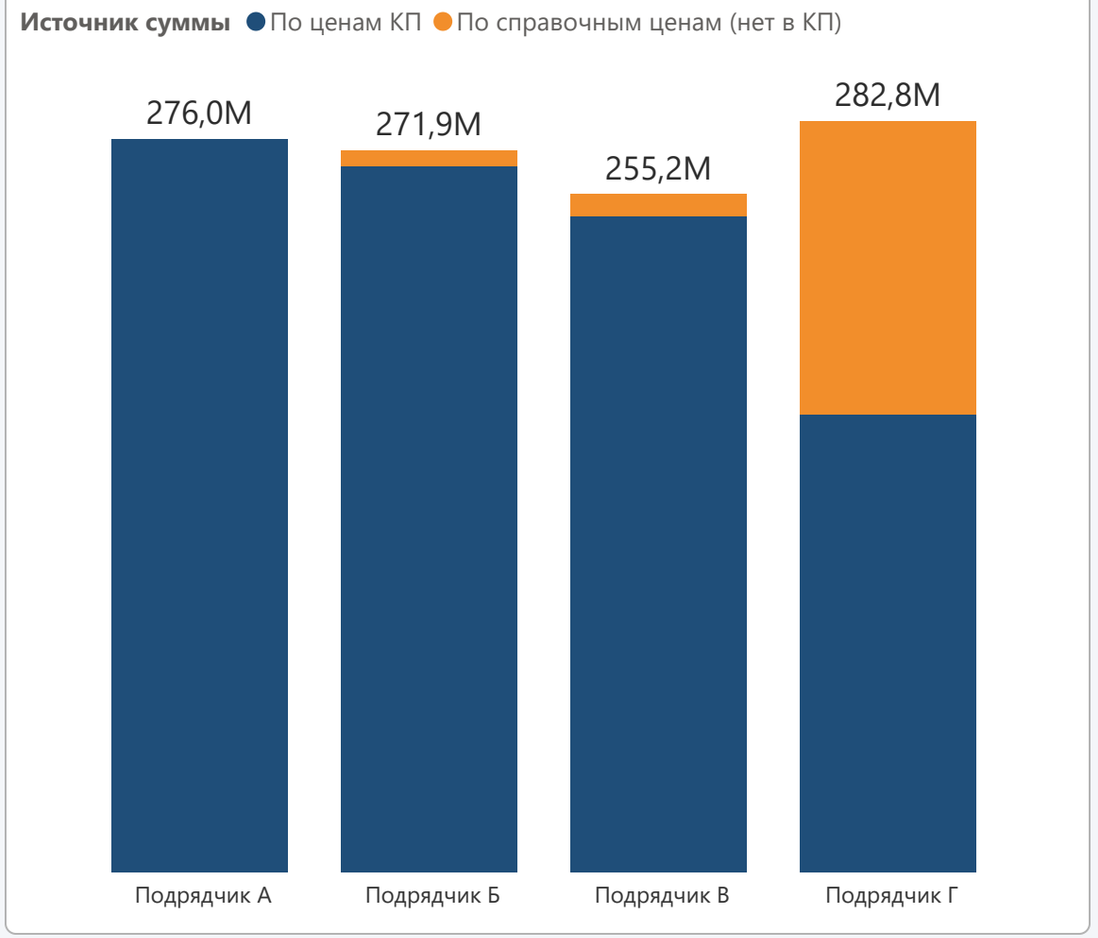

Состав итоговой стоимости, млн руб.

Итого = цены из КП + позиции без цены в КП по справочным ценам.

Подрядчик	По ценам КП	По справочным ценам	Итого	Доля справочных цен
Подрядчик А	276,0M	0,0M	276,0M	0%
Подрядчик Б	265,9M	6,0M	271,9M	2%
Подрядчик В	247,0M	8,2M	255,2M	3%
Подрядчик Г	172,4M	110,4M	282,8M	39%

Стоимость проекта различается на 11%

- Самое низкое предложение у Подрядчика В (255,2 млн руб.), самое высокое у Подрядчика Г (282,8 млн руб.).
- Подрядчик А назвал цену на все 45 позиций проекта. Для остальных подрядчиков недостающие позиции рассчитаны по справочным ценам.
- У Подрядчика Г недостающих позиций 26 из 45, поэтому его итог приблизительный.
- У Подрядчика В нет пусконаладки и не указан состав цены работ, поэтому его цену нужно уточнить.

Методика. Позиция - наименование из ведомости объёмов (всего 45).
Итого = цены из КП + позиции без цены в КП по справочным ценам. Цены без НДС на 31.03.2026, индексация 8,5% в год (условная). Данные учебные.

Позиции для проверки

Позиции для проверки

Цены в КП, которые нельзя принять без уточнения: отличаются от справочных больше чем на 15% или несопоставимы с ними

Цен в КП проверено	Требуют проверки	В норме
143	8	135

Подрядчик	Позиция в КП	Отклонение	Причина	Что сделать
Подрядчик Б	Опоры ВЛ 110 кВ металлические		Другая единица измерения	Пересчитать цену в единицу ведомости
Подрядчик Б	Устройство монолитных фундаментов В25 (работа, бетон заказчика)	-65%	Другой состав цены	Уточнить состав цены или добавить стоимость материала
Подрядчик Г	КРУ 10 кВ: поставка, монтаж и ПНР (под ключ)		Нет в справочнике	Нет прямого аналога: сравнивать по сумме позиций ведомости
Подрядчик Г	Шеф-монтаж оборудования		Нет в справочнике	Нет прямого аналога: сравнивать по сумме позиций ведомости
Подрядчик В	Устройство песчаной подушки	-50%	Состав цены не указан	Запросить состав цены: включены ли материалы
Подрядчик Б	Арматурные работы (фундаменты) (с материалами)	+53%	Цена выше справочной	Запросить у подрядчика обоснование цены
Подрядчик В	Кабель силовой 10 кВ АПвПу 3х240	+34%	Цена выше справочной	Запросить у подрядчика обоснование цены
Подрядчик Б	ОПН-110 кВ	-40%	Цена ниже справочной	Проверить тип и производителя: цена ниже справочной

Порог отклонения от справочной цены ±15%. «Другой состав цены» и «Состав цены не указан»: цену нельзя сравнивать со справочной, пока подрядчик не подтвердит, что входит в цену (материалы, доставка). У Подрядчика Б опоры указаны в штуках, в ведомости они в тоннах. «КРУ под ключ» и шеф-монтаж Подрядчика Г не имеют прямого аналога в справочнике. Данные учебные.

Сравнение КП

Позиции без цены в КП

Позиции из ведомости, на которые подрядчик не назвал цену. Мы рассчитали их по справочным ценам

Подрядчик

All

По справочным ценам, млн руб.	Позиций без цены в КП
124,6M	36

Подрядчик	Вид затрат	Позиция	Ед.	Объём	Справочная цена, руб.	Сумма по справочным ценам, руб.
Подрядчик Г	МТРиОб	Опора стальная многогранная ВЛ 110 кВ	т	118	146 300	17 263 400
Подрядчик Г	МТРиОб	Провод неизолированный АС 240/32	т	34	402 100	13 671 400
Подрядчик Г	СМР	Благоустройство и устройство проездов	м2	3 200	2 959	9 468 800
Подрядчик Г	СМР	Бетонирование фундаментов В25	м3	960	9 543	9 161 280
Подрядчик Г	СМР	Армирование фундаментов	т	72	112 300	8 085 600
Подрядчик Г	СМР	Монтаж провода ВЛ 110 кВ (12 км х 3 фазы)	км	36	214 900	7 736 400
Подрядчик Г	МТРиОб	Кабель силовой 10 кВ АПвПу 3х240	м	1 800	4 109	7 396 200
Подрядчик Г	СМР	Монтаж опор ВЛ 110 кВ	т	118	44 630	5 266 340
Подрядчик Г	СМР	Устройство фундаментов опор ВЛ	м3	320	14 330	4 585 600
Подрядчик Г	СМР	Устройство кабельных лотков	м	1 500	2 732	4 098 000
Подрядчик Г	СМР	Устройство заземляющего контура	м	2 400	1 386	3 326 400
Подрядчик Г	СМР	Устройство ограждения подстанции	м	620	4 994	3 096 280
Подрядчик Б	ПНР	ПНР АСУ ТП подстанции	компл	1	2 505 000	2 505 000
Подрядчик В	ПНР	ПНР АСУ ТП подстанции	компл	1	2 505 000	2 505 000
Подрядчик Г	СМР	Монтаж силового трансформатора	шт	2	1 224 000	2 448 000
Подрядчик Г	СМР	Устройство грозозащитного троса	км	12	177 600	2 131 200
Подрядчик Г	СМР	Прокладка силового кабеля 10 кВ	м	1 800	1 149	2 068 200
Итого						**124 610 340**

Позиции со статусом «нет в КП»: подрядчик не назвал на них цену. Сумма = справочная цена × объём из ведомости, цены приведены к 31.03.2026. «КРУ под ключ» Подрядчика Г покрывает три позиции (ячейка КРУ, монтаж и ПНР ячейки) и в этот список не входит. Данные учебные.

Сравнение КП

Позиции для проверки
